

Comité de Usuarios #10

#TransformaciónDCV

31 de marzo 2022

DCV 

DCV  REGISTROS

DCV  ASESORÍAS
Y SERVICIOS





Micrófonos y cámaras
apagadas



Preguntas por
el chat



Revise que su nombre esté
visible correctamente

Agenda

- 1. Día Cero – Proyecto DCVe.**
- 2. Preparación salida al mercado - habilitación del ambiente de producción DCVe:**
 - Resumen.
 - Avances a la fecha.
- 3. Etapas de capacitación y entrenamiento:**
 - Pruebas finales DCVe / clientes.
 - Resultados del ensayo DCVe - 14 y 15 de marzo 2022.
 - Taller (última instancia de capacitación/entrenamiento).
 - Webinar soporte/atención.
- 4. Cierre del proceso por parte del Comité de Usuarios.**



Replanificación **Puesta en Producción** Proyecto DCVe.


Se informa re agendamiento planificado [para el 20 de junio de 2022.](#)

Principales razones:

- Desfase en las liberaciones de nuevas versiones.
- Feriado en USA e interferiado en Chile.
- Asegurar la activación de depositantes en producción, a través de trabajos/sesiones bilaterales.

Todo lo anterior, para asegurar la correcta implementación de la nueva Plataforma DCVe, en conjunto con el mercado.

Plan de Capacitación General DCVe 2021-2022

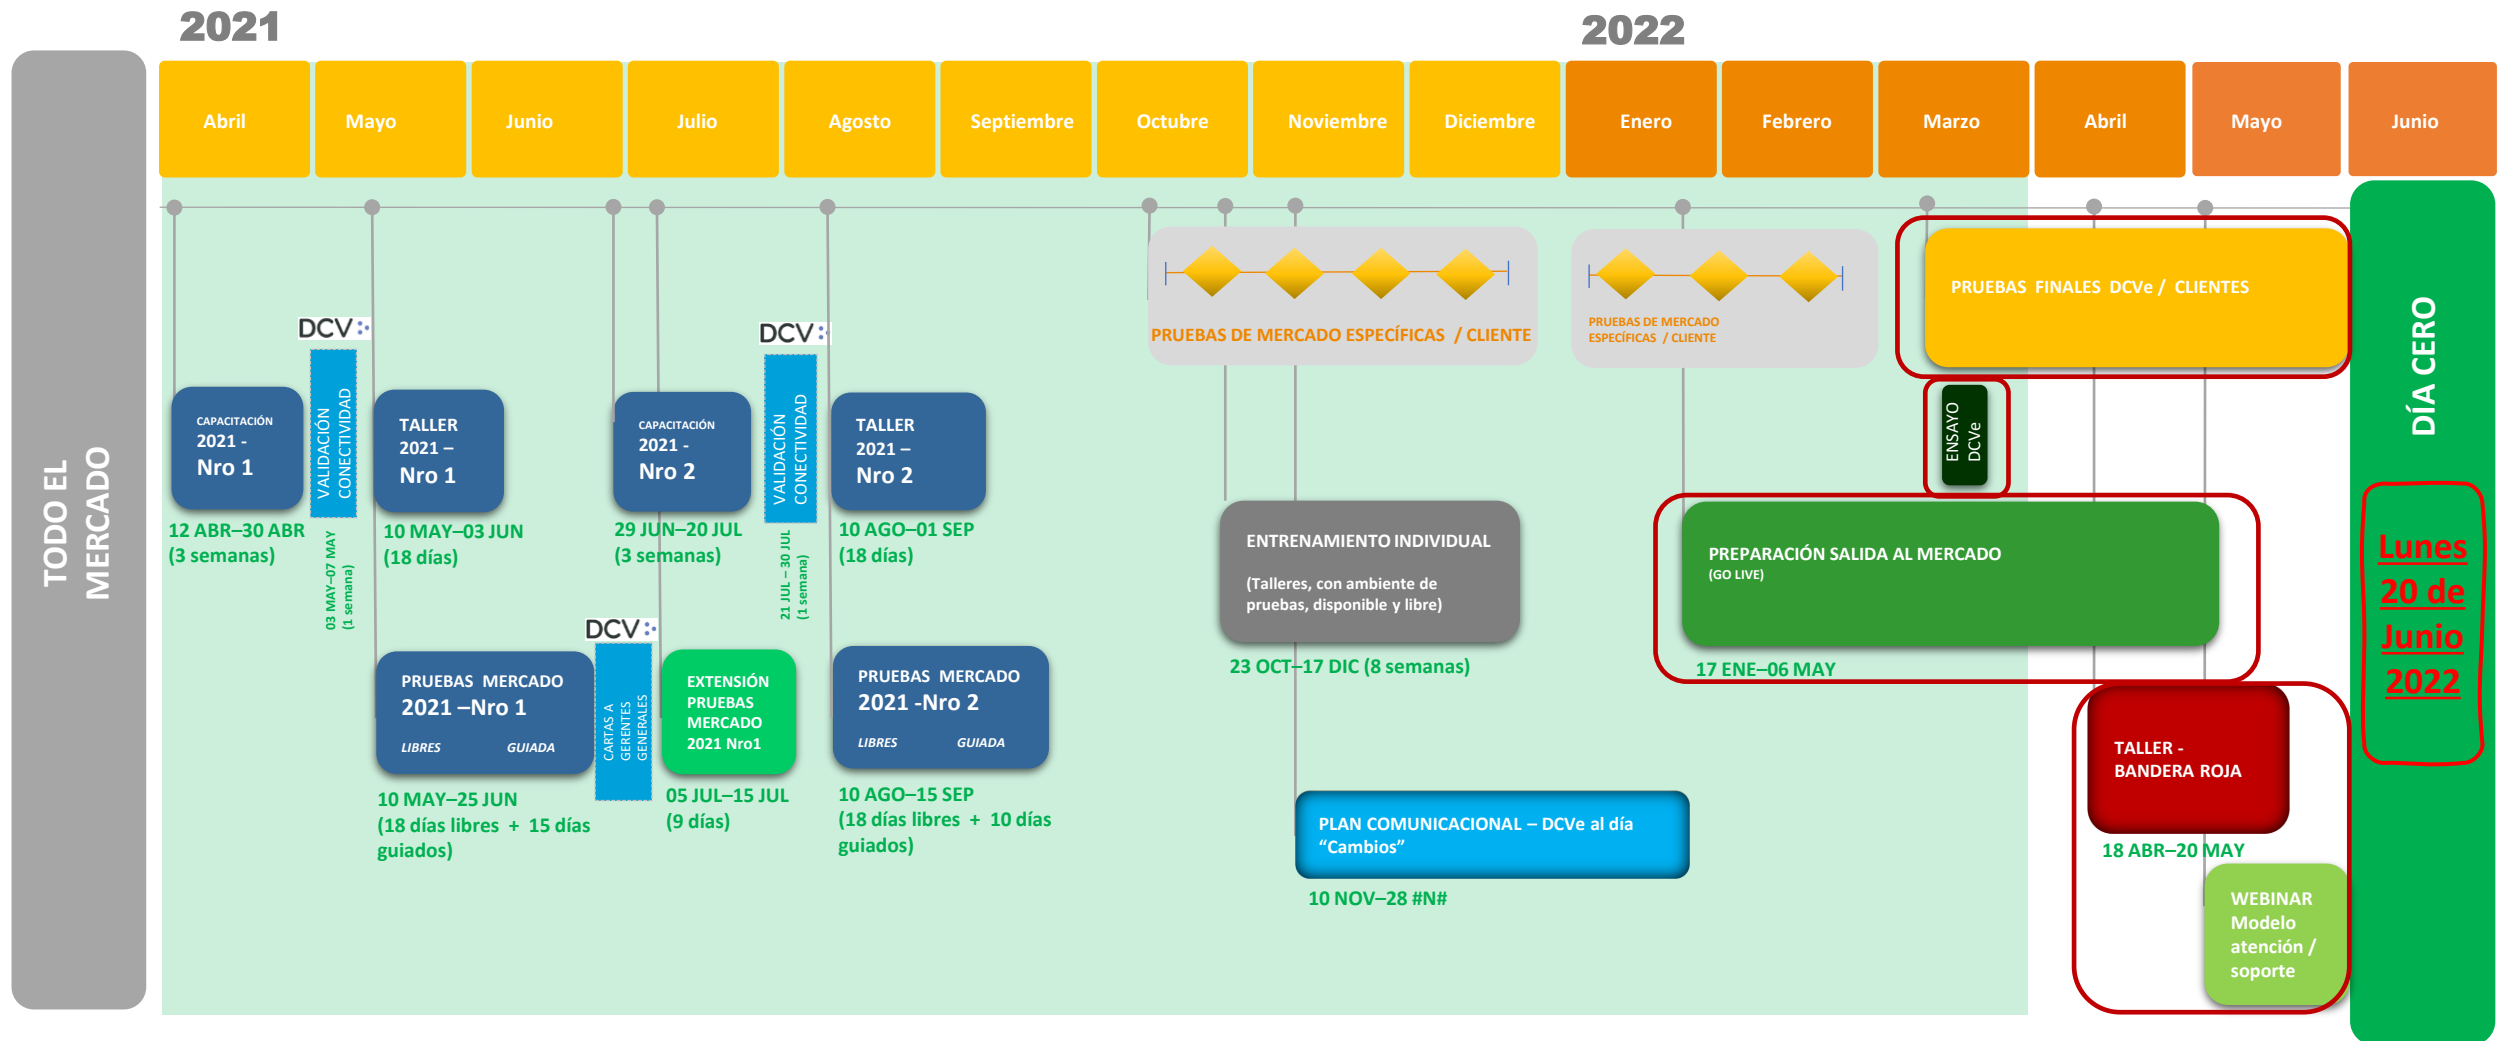

Agenda

1. Día Cero – Proyecto DCVe.

2. Preparación salida al mercado - habilitación del ambiente de producción DCVe:

- Resumen.
- Avances a la fecha.

3. Etapas de capacitación y entrenamiento:

- Pruebas finales DCVe / clientes.
- Resultados del ensayo DCVe - 14 y 15 de marzo 2022.
- Taller (última instancia de capacitación/entrenamiento).
- Webinar soporte/atención.

4. Cierre del proceso por parte del Comité de Usuarios.



2. Preparación salida al mercado – Comité de usuarios

Actividades y Plazos:

i. **“Activación Preliminar”**: Fecha límite 31 de marzo 2022.

- Al menos 2 administradores de Seguridad habilitados.
- Administradores conectados en DCVe producción (Acceso + RSA + Credenciales).
- Asignar roles de producción, a un par de operadores.

EN PROCESO:

- 11 depositantes Comité de Usuarios, pendientes a la fecha (de un total de 39).

ii. **“Activación Final (Día 0)”**: Fecha límite 15 de abril 2022.

- Al menos 2 administradores de Seguridad habilitados (más, 1 back up).
- Todos los usuarios necesarios para operar conectados en DCVe producción (Acceso + RSA + Credenciales).
- Equipos críticos para operar con roles de producción asignados.


2. Preparación salida al mercado

DCV Evolución Activación producción Situación al 30 marzo 2022.

Foco, en adelante:

- ii. "Activación Final (Día 0)": **Fecha límite 15 de abril 2022**
 - Al menos 2 administradores de Seguridad habilitados (más, 1 back up).
 - Todos los usuarios necesarios para operar conectados en DCVe producción (Acceso + RSA + Credenciales).
 - Equipos críticos para operar con roles de producción asignados.

ACTIVACIÓN
AMBIENTE PRODUCCIÓN
Comité Usuarios

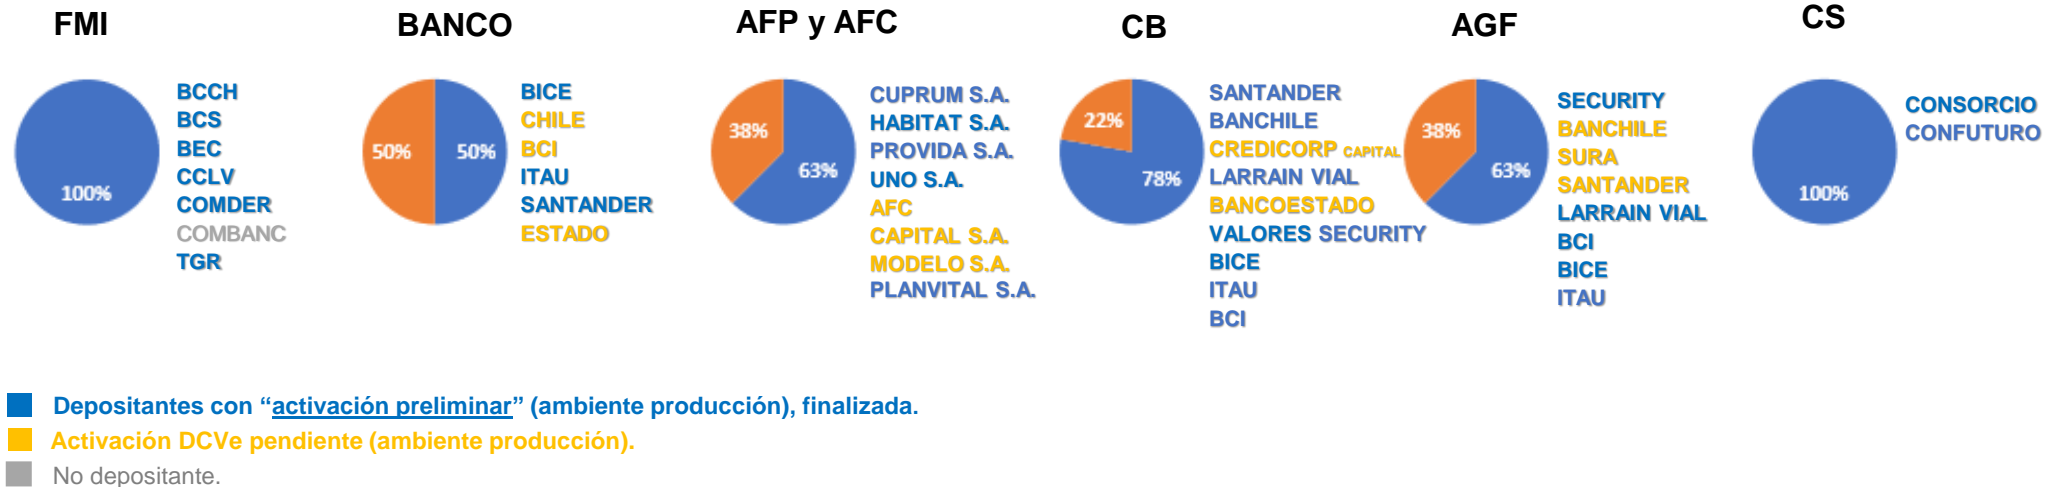

RESUMEN:

Comité de Usuarios: 39 depositantes.

- 72% depositantes con "activación preliminar" finalizada: 28 depositantes.
- 28% depositantes, con activación pendiente: 11 depositantes.
- 95% depositantes, se han conectado al ambiente de producción: 37 depositantes.

Agenda

- 1. Día Cero – Proyecto DCVe.**
- 2. Preparación salida al mercado - habilitación del ambiente de producción DCVe:**

- Resumen.
- Avances a la fecha.

3. Etapas de capacitación y entrenamiento:

- Pruebas finales DCVe / clientes.
- Resultados del ensayo DCVe - 14 y 15 de marzo 2022.
- Taller (última instancia de capacitación/entrenamiento).
- Webinar soporte/atención.

- 4. Cierre del proceso por parte del Comité de Usuarios.**



Nueva etapa

Pruebas finales DCVe / Clientes

PRUEBAS FINALES DCVe / CLIENTES

Objetivo:

Etapa que permite reforzar, de manera específica y coordinada^() con un grupo de clientes (2 o 3), **escenarios que se han definido como críticos**, en las nuevas liberaciones de la Plataforma DCVe.*

Críticos: escenarios que son invalidantes para la partida, si éstos estuviesen con algún problema.

Estrategia – Foco/Alcance:

- Depositante: Operaciones DvP/Combanc.
- CCLV y Bolsa: Finalizar ciclos de pruebas.
- BCCh: Pruebas integrales de la Plataforma DCVe.
- Eventos de Capital: Formatos generales.
- Prendas: Foco en los reportes.

(*) Para coordinaciones especiales, contactar a su Ejecutivo DCVe.

3. Etapas de capacitación y entrenamiento



DCV Evolución Ensayo DCVe, 14 y 15 Marzo 2022.

PRÓXIMO ENSAYO:
Objetivo → Cuadratura de eventos.

Alcance:

- ❑ Definiciones:
 1. **Cuando:** Realizadas el lunes y martes 14 y 15 de marzo.
 2. **Requisitos:** Confirmar participación, y haber implementado la conectividad al ambiente de producción.
 3. **Validaciones:** Solamente conectividad y cuadratura de cuentas, instrumentos y saldos.
 4. **Control:** Envío de evidencia.

- ❑ Participantes:
 - 17 integrantes del Comité de Usuarios (de 20 activados).

❑ Resumen de resultados:

Alcance	Resultado	Cantidad depositantes	%
1. Validación de Conexión	OK	17	100%
2. Validación de saldos	OK	13	76%
	NO OK (en análisis)	4	24%

Participantes Ensayo DCVe - Comité de Usuarios:

1. AFP HABITAT S.A.
2. AFP UNO S.A.
3. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
4. BANCO BICE
5. BANCO CENTRAL DE CHILE (BCCH)
6. BANCO SANTANDER-CHILE
7. BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
8. BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.
9. BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES
10. BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES
11. CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
12. COMDER, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
13. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
14. ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15. ITAU CORPBANCA
16. ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA.
17. SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

3. Etapas de capacitación y entrenamiento

DCV Evolución Taller – Bandera Roja



Identificación del conjunto de acciones/pasos, alineados con las tareas definidas, considerando....

01

Características:

- Última instancia de **entrenamiento/capacitación**, previo al día cero.
- Para **todos los depositantes del mercado**.
- **Cada sesión**, liderada por un Ejecutivo DCVe, considera abordar 1 módulo crítico.

02

Programación:

- **10 módulos críticos:** 18 abr – 20 may.
M1: Administrador de Seguridad.
M2: Administrador de Seguridad – POA.
M3: Administrador de Seguridad – Conf. Supervisión.
M4: Custodia Nacional – Operaciones.
M5: Custodia Nacional – Cuentas de Tesorería.
M6: Prendas.
M7: Eventos de capital.
M8: Custodia Internacional
M9: Consultas.
M10: BRAA.



03

Elementos de apoyo:

- Todas las sesiones serán grabadas, y quedarán disponibles en el sitio web DCV – Proyecto DCVe.
- El material anterior, se adiciona/complementa al actualmente disponible en el sitio web DCV – Proyecto DCVe.

DCV Evolución **Webinar Soporte/Atención**

WEBINAR
Modelo
atención /
soporte

- **Programación:**
 - Sesión #1: Miércoles 4 de mayo 2022 (*).
 - Sesión #2: Miércoles 11 de mayo 2022 (*).

(*) Cada sesión abordará el mismo contenido.

Agenda

- 1. Día Cero – Proyecto DCVe.**
- 2. Preparación salida al mercado - habilitación del ambiente de producción DCVe:**
 - Resumen.
 - Avances a la fecha.
- 3. Etapas de capacitación y entrenamiento:**
 - Pruebas finales DCVe / clientes.
 - Resultados del ensayo DCVe - 14 y 15 de marzo 2022.
 - Taller (última instancia de capacitación/entrenamiento).
 - Webinar soporte/atención.
- 4. Cierre del proceso por parte del Comité de Usuarios.**



DCV Evolución **Comité de Usuarios.**

OBJETIVO:

Realizar un cierre formal con los integrantes del comité de usuarios, de las etapas y actividades claves, a objeto de documentar y reconocer el trabajo realizado por todas las partes:

- Conexión ambiente de producción. (SI/NO)
- Designación de al menos 2 administradores de seguridad, según protocolo vigente DCV. (SI/NO)
- Operadores activados en ambiente de producción. (SI/NO)
- Participación en capacitaciones/talleres. (SI/NO)
- etc...

A low-angle, black and white photograph of a modern skyscraper with a glass facade, looking up towards the top of the building. The sky is visible through the glass panels.

DCV

www.dcv.cl

[LinkedIn](#) Depósito Central de Valores (DCV)

DCV REGISTROS

DCV ASESORÍAS
Y SERVICIOS
